

# QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN

01. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG A

02. QUẢN LÝ THANH TOÁN A

03. QUẢN LÝ CÔNG NỢ A

=====

04. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG B

05. QUẢN LÝ THANH TOÁN B

06. QUẢN LÝ CÔNG NỢ B

07. QUẢN LÝ BẢO LÃNH HỢP ĐỒNG

**NHẬT NGHE**

**NÂNG TẦM XÂY DỰNG VIỆT**

# BẢNG TỔNG HỢP THEO DỐI HỢP ĐỒNG CHỦ ĐẦU TƯ - THẦU CHÍNH

COVER

I\_Loai\_DA

A\_Giatri\_HD\_VAT  
15,31 NT

A\_CC1\_Dexuat  
6,68 NT

A\_CDT\_duyet  
6,61 NT

A\_Chuyen\_Tien  
6,61 NT

A\_Chuyen\_Tien  
6,61 NT

Ten\_DA

A\_Khachhang

A_Khachhang	A_CC1_Dexuat	A_Chuyen_Tien	A_Congno
BQLDA ĐTXD Hạ tầng Đô Thị	56,94 T	13,18 T	43,76 T
VSIP-SEMBCORP GATEWAY	262,53 T	239,71 T	22,82 T
Cty TNHH ĐT BĐS Long Hưng Phát	196,54 T	181,44 T	15,10 T
BQLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh Tiền Giang	999,99 T	985,75 T	14,24 T
Doosan Enerbility Việt Nam	874,81 T	866,19 T	8,62 T
SECL	478,08 T	472,05 T	6,03 T
Lilama	212,89 T	211,62 T	1,27 T
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,68 NT</b>	<b>6,61 NT</b>	<b>69,34 T</b>

Ten_DA	A_Giatri_HD_VAT	A_CC1_Dexuat	A_Chuyen_Tien	A_CDT_duyet	A_Giuquye toan	A_Giubaoh anh	A_Congno
Đường liên Tỉnh XL12	82,65 T	24,23 T	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23 T
KDC cao cấp Melia	980,17 T	262,53 T	239,71 T	262,53 T	0,00	20,57 T	22,82 T
Đường liên Tỉnh XL11	111,59 T	32,71 T	13,18 T	0,00	0,00	0,00	19,53 T
Nhà máy công nghệ cao Tiến Phát	382,67 T	185,81 T	171,09 T	171,09 T	0,00	8,03 T	14,72 T
Bệnh Viện Forgive	1,03 NT	999,99 T	985,75 T	999,99 T	0,00	0,00	14,24 T
Cầu Dây văng 1	165,65 T	132,83 T	122,98 T	132,83 T	8,83 T	0,00	9,86 T
Nhà máy công nghệ cao Thăng Lợi	232,59 T	232,66 T	226,62 T	232,66 T	0,00	10,56 T	6,03 T
Đê Chấn sóng Biển	100,84 T	63,70 T	58,46 T	63,70 T	14,27 T	0,00	5,24 T
Nhà máy Phát Tài	103,45 T	98,52 T	97,53 T	98,52 T	0,00	4,70 T	989,69 Tr
Nhà máy Thanh Minh	105,31 T	92,41 T	92,13 T	92,41 T	0,00	4,41 T	280,36 Tr
Khách sạn Legend Complex	66,29 T	13,26 T	13,00 T	13,00 T	0,00	0,00	258,57 Tr
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,31 NT</b>	<b>6,68 NT</b>	<b>6,61 NT</b>	<b>6,61 NT</b>	<b>42,21 T</b>	<b>187,93 T</b>	<b>69,34 T</b>

Ten_DA	A_Sohopdong	A_PLhopdong	A_NoidungH D	A_TYLE_Than h_toan	A_TYLE_Ta m_ung	A_TYLE_Qu yettoan	A_TYLE_Bao _hanh	A_Bao_h anh	A_Tam_u ng	A_Than h_toan	A_Giatri_H D_VAT
Bệnh Viện Forgive	2012/2018/HĐXD	2012/2018/HĐXD-PLHD-15	HĐ Chính	100,00%	60,00%	-	5,00%	720	7	11	-16,21 T
Bệnh Viện Tâm Tâm	37/2019/HĐXD	PL-09	HĐ Chính	100,00%	45,00%	-	3,00%	720	7	7	-10,93 T
Nhà máy Thanh Minh	C18/SH1-LLM-CC1	PL01	HĐ Chính	95,00%	15,00%	-	5,00%	720	35	28	-10,12 T
Nhà hát My Dream	11/2019/HĐXD	11/2019/HĐXD-PL07	HĐ Chính	100,00%	50,00%	5,00%	5,00%	720	7	7	-2,69 T
Bệnh Viện Forgive	2012/2018/HĐXD	2012/2018/HĐXD-PLHD-14	HĐ Chính	100,00%	60,00%	-	5,00%	720	7	11	-2,45 T
Bệnh Viện Forgive	2012/2018/HĐXD	2012/2018/HĐXD-PLHD-21	HĐ Chính	100,00%	60,00%	-	5,00%	720	7	11	-2,24 T
<b>Tổng cộng...</b>											<b>15,31 NT</b>


# BẢNG TỔNG HỢP THEO DỐI THANH TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ - THẦU CHÍNH

COVER

A\_Khach\_hang

Ten\_DA

A\_Nganhang



A\_Giatri\_HD\_VAT  
15,31 NT

A\_CC1\_Dexuat  
6,68 NT

A\_CDT\_duyet  
6,61 NT

A\_Chuyen\_Tien  
6,61 NT

A\_Chuyen\_Tien  
6,61 NT

A_Nganhang	A_Chuanhan
Vietbank	-59,53 T
Viettinbak	-41,41 T
SHB	-28,85 T
Sacombank	-15,10 T
BIDV	42,75 T
<b>Tổng cộng</b>	<b>-102,14 T</b>

A_Nganhang	A_Tg_toihan	A_Chuanhan
Vietbank	11 thg 1, 2023	-24,23 T
SHB	12 thg 6, 2023	-22,82 T
Vietbank	30 thg 12, 2022	-19,53 T
Viettinbak	1 thg 1, 2023	-14,84 T
<b>Tổng cộng</b>		<b>-102,14 T</b>

A_Khach_hang	Tối hạn	Trễ hạn	Nợ xấu	Nợ khó đòi
Vinhomes	-	42,75 T	-	-
VSIP-SEMBCORP GATEWAY	-	-	-	-22,82 T
Tracodi	-	-258,57 Tr	-	-
SECL	-	-	-5,28 T	-750,07 Tr
Lilama	-	-1,27 T	-	-
Doosan Enerbility Việt Nam	6,10 T	-14,72 T	-	-
Cty TNHH ĐT ĐVB Hải Phòng	-	-	-32,79 T	-
Cty TNHH ĐT BĐS Long Hưng Đ	0,96 T	220,00 Tr	5,02 T	-


Ten_DA	Kyhieu_HS	A_Tg_CC1_Dexuat	Tg_Trinhhoso	A_Tg_toihan	A_Tg_tre_HS	A_TTHSTT	A_Nghiemthu_VAT	A_CC1_Dexuat	A_BQLDA_duyet	A_TVGS_duyet	A_Chuyen_Tien
1. Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Tam_ung	31 thg 12, 2022	-	26 thg 1, 2023	0	Hoàn thành	0,00	570,80 T	570,80 T	570,80 T	570,80 T
2. Nhà máy công nghệ cao Tùng Lâm	HS_Tam_ung	-	-	12 thg 2, 2023	-173	Hoàn thành	575,77 T	518,19 T	518,19 T	518,19 T	518,19 T
3. Bệnh Viện Forgive	HS_Tam_ung 2	26 thg 12, 2019	-	6 thg 1, 2020	0	Hoàn thành	0,00	269,78 T	269,78 T	269,78 T	269,78 T
4. Bệnh Viện Forgive	HS_Tam_ung 1	26 thg 12, 2019	-	6 thg 1, 2020	0	Hoàn thành	0,00	269,78 T	269,78 T	269,78 T	269,78 T
5. Nhà máy công nghệ cao Tùng Lâm	HS_Thanh_toan 1	-	-	26 thg 2, 2023	-159	Hoàn thành	265,92 T	228,39 T	228,39 T	228,39 T	228,39 T
6. Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan_22	31 thg 12, 2022	-	26 thg 1, 2023	0	Hoàn thành	200,48 T	200,48 T	200,48 T	200,48 T	200,48 T
7. Nhà hát Dream Song	HS_Tam_ung	22 thg 12, 2022	-	11 thg 1, 2023	-8	Hoàn thành	0,00	169,00 T	169,00 T	169,00 T	169,00 T
8. Bệnh Viện Happiness	HS_Tam_ung 1	16 thg 12, 2022	-	29 thg 12, 2022	-3	Hoàn thành	0,00	152,49 T	152,49 T	152,49 T	152,49 T
9. Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan_19	31 thg 12, 2022	-	26 thg 1, 2023	0	Hoàn thành	117,87 T	117,87 T	117,87 T	117,87 T	117,87 T
10. KDC cao cấp Melia	HS_Tam_ung	19 thg 7, 2022	-	6 thg 8, 2022	-15	Hoàn thành	0,00	90,76 T	90,76 T	90,76 T	90,76 T
11. Bệnh Viện Forgive	HS_Thanh_toan 28	31 thg 12, 2021	-	4 thg 2, 2022	-4	Hoàn thành	69,46 T	69,46 T	69,46 T	69,46 T	69,46 T
<b>Tổng cộng</b>							<b>8,04 NT</b>	<b>7,54 NT</b>	<b>6,89 NT</b>	<b>6,87 NT</b>	<b>7,39 NT</b>

# BẢNG TỔNG HỢP THEO DỐI CÔNG NỢ CHỦ ĐẦU TƯ - THẦU CHÍNH

COVER

A\_Khach\_hang

Ten\_DA



Cảnh báo Hồ sơ	Số ngày chậm	Đánh giá
Thời gian nhiều hơn	0 Ngày	Bình thường
Thời gian ít hơn	0 Ngày	Trễ hạn
Thời gian ít hơn	-30 Ngày	Nợ khó đòi
Thời gian ít hơn	-60 Ngày	Nợ xấu

A_Khach_hang	A_Phan_loai_no	A_Chuanhan
1. Vinhomes	Trễ hạn	42,75 T
2. Doosan Enerbility Việt Nam	Tới hạn	6,10 T
3. Cty TNHH ĐT BĐS Long Hưng Phát	Trễ hạn	-220,09 Tr
4. Tracodi	Trễ hạn	-258,57 Tr
5. SECL	Nợ khó đòi	-750,07 Tr
6. Lilama	Trễ hạn	-1,27 T
7. BQLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh Tiền ...	Nợ xấu	-3,31 T
8. Cty TNHH ĐT BĐS Long Hưng Phát	Nợ xấu	-5,02 T
9. SECL	Nợ xấu	-5,28 T
10. Cty TNHH ĐT BĐS Long Hưng Phát	Tới hạn	-9,86 T
<b>Tổng cộng</b>		<b>-102,14 T</b>

A_Phan_loai_no	A_Nguyennhan	A_Chuanhan
1. Tới hạn	Chưa đủ điều kiện thanh toán	-29,39 T
2. Tới hạn	Không đủ nhận lực	6,10 T
3. Trễ hạn	Vướng các thủ tục pháp lý	-960,38 Tr
4. Trễ hạn	Chưa hoàn chỉnh hồ sơ	-309,67 Tr
5. Trễ hạn	Chưa đủ điều kiện thanh toán	42,50 T
6. Trễ hạn	Không đủ nhận lực	-14,94 T
7. Nợ xấu	Chưa đủ điều kiện thanh toán	-62,04 T
8. Nợ xấu	Không đủ nhận lực	-8,60 T
9. Nợ khó đòi	Chưa đủ điều kiện thanh toán	-22,82 T
10. Nợ khó đòi	Không đủ nhận lực	-11,68 T
<b>Tổng cộng</b>		<b>-102,14 T</b>

Ten_DA	Kyhieu_HS	A_Tg_toihan	A_Tg_tre_HS	A_Phan_loai_no	A_Nguyennhan	A_BQLDA_duyet	A_Chuyen_Tien	A_Chuanhan
1. Bệnh Viện Forgive	HS_Thanh_toan_BH	thg 1 2025	-713	Nợ xấu	Không đủ nhận lực	51,55 T	48,23 T	-3,31 T
2. Nhà máy Phát Tài	HS_Thanh_toan 7	thg 8 2020	-28	Trễ hạn	Vướng các thủ tục pháp lý	25,15 T	25,23 T	82,67 Tr
3. KDC cao cấp Melia	HS_Thanh_toan 8	thg 6 2023	-53	Nợ khó đòi	Chưa đủ điều kiện thanh toán	22,82 T	-	-22,82 T
4. Nhà máy Thanh Minh	HS_Thanh_toan 7	thg 2 2021	-28	Trễ hạn	Chưa hoàn chỉnh hồ sơ	21,51 T	21,53 T	18,57 Tr
5. KDC cao cấp Estela	HS_Tam_ung 1	thg 6 2022	-4	Trễ hạn	Chưa đủ điều kiện thanh toán	15,65 T	15,65 T	15,65 T
6. Đường liên Tỉnh XL3	HS_Thanh_toan 32	thg 1 2023	-215	Nợ xấu	Chưa đủ điều kiện thanh toán	14,84 T	-	-14,84 T
7. Nhà máy công nghệ cao Tiến Phát	HS_Thanh_toan 13	thg 7 2023	-26	Trễ hạn	Không đủ nhận lực	14,72 T	0,00	-14,72 T
8. Khách sạn Legend Complex	HS_Tam_ung 1	thg 7 2021	-7	Trễ hạn	Chưa đủ điều kiện thanh toán	13,26 T	13,00 T	-258,57 Tr
9. Đường liên Tỉnh XL3	HS_Thanh_toan 34	thg 3 2023	-156	Nợ xấu	Chưa đủ điều kiện thanh toán	12,01 T	-	-12,01 T
10. Bệnh Viện Forgive	HS_Thanh_toan 32	thg 3 2023	-53	Nợ khó đòi	Không đủ nhận lực	10,93 T	0,00	-10,93 T
11. Nhà máy Phát Tài	HS_Thanh_toan 2	thg 10 2019	-28	Trễ hạn	Chưa hoàn chỉnh hồ sơ	10,19 T	10,11 T	-82,67 Tr
<b>Tổng cộng</b>						<b>310,35 T</b>	<b>228,43 T</b>	<b>-102,14 T</b>

# BẢNG TỔNG HỢP THEO DỐI HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

COVER

I\_Loai\_DA

Ten\_DA

Nha\_thau\_thi\_cong

B\_Giatrihopdong\_VAT  
3.145,01 NT

B\_Nghiemthu\_VAT  
6,48 NT

B\_Dexuat\_thanhtoan  
7,09 NT

B\_BDHDA\_Duyet  
6,99 NT

B\_Chuyen\_Tien  
6,84 NT

Nhathau_viettac	B_Giatrihopdong_VAT	B_Nghiemthu_VAT	B_Chuyen_Tien
Văn Hà	1,24 NT	1,10 NT	1,07 NT
Phú Văn	595,42 T	595,42 T	545,75 T
Navicons	483,53 T	481,99 T	482,07 T
Nam Thịnh	611,40 T	354,59 T	358,31 T
Trường Lộc	728,85 T	346,47 T	481,22 T
Phú Văn - CC1	566,33 T	310,44 T	275,19 T
SHC	345,26 T	225,81 T	238,41 T
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.145,01 NT</b>	<b>6,48 NT</b>	<b>6,84 NT</b>

Ten_DA	B_Giatrihopdong_VAT	B_Nghiemthu_VAT	B_Dexuat_thanhtoan	B_BDHDA_Duyet	B_Chuyen_Tien
Đại Lộ No2	1.569,22 NT	69,93 T	72,37 T	72,37 T	72,37 T
Đường liên Tỉnh XL9	2,30 NT	379,89 T	539,15 T	539,15 T	539,15 T
Đường liên Tỉnh XL8	183,92 T	165,20 T	158,20 T	158,20 T	158,20 T
Đường liên Tỉnh XL5	245,54 T	36,14 T	102,26 T	102,26 T	102,26 T
Đường liên Tỉnh XL4	936,63 T	213,74 T	212,66 T	212,66 T	212,66 T
Đường liên Tỉnh XL3	743,29 T	682,32 T	619,22 T	619,42 T	607,85 T
Đường liên Tỉnh XL2	96,56 T	78,74 T	75,43 T	75,43 T	73,19 T
Đường liên Tỉnh XL10	54,79 T	0,00	0,00	0,00	0,00
Đường liên Tỉnh XL1	265,05 T	97,29 T	100,25 T	100,25 T	90,96 T
Đê Chấn sóng Biển	98,62 T	76,26 T	62,30 T	62,30 T	56,42 T
Trụ sở Liên Minh	80,97 T	8,70 T	30,11 T	0,00	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.145,01 NT</b>	<b>6,48 NT</b>	<b>7,09 NT</b>	<b>6,99 NT</b>	<b>6,84 NT</b>

Nha_thau_thi_cong	Noi_dung_hop_dong	B_So_Hopdongchinh	B_So_PLHD	B_Ngay ky	B_TYLE_Tamung	B_TYLE_Thanhtoan	B_TYLE_Baoanh	B_Giatrihopdong_VAT
Công ty cổ phần kỹ thuật Nông Giếng	Điều chỉnh tài khoản cty: 1234568789 - SHB - CN HCM	10/2020/ĐKTG/HĐXD	10f/2021/ĐKTG/PLHD	2022-01-26	20,00%	95,00%	3,00%	-
Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc	Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng: từ 18/3/2022 đến 30/6/2022	05/2020/ĐKTG/HĐXD	05g/2020/ĐKTG/HĐXD	2022-03-30	20,00%	95,00%	3,00%	-
Công ty TNHH quốc tế Lam Kinh	Gia hạn tiến độ	30-03/2023/PLHD/CC1-LAMKINH	PL03	2023-03-21	-	-	-	-
Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng 30/11/2022	03/2020/ĐKTG/HĐXD	03J/2021/ĐKTG/PLHD	2022-06-30	20,00%	95,00%	3,00%	-
Công ty cổ phần xây dựng và cơ điện Việt Tín	Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng: 31/12-2021	09/2020/ĐKTG/HĐXD	09d/2020/ĐKTG/HĐXD	2021-11-25	30,00%	95,00%	3,00%	-

Tổng cộng 3.145,01 NT

# BẢNG TỔNG HỢP THEO DỐI THANH TOÁN NHÀ THẦU PHỤ

COVER

B\_Phan\_loai\_no

Nhathau\_viettac

Ten\_DA

B\_Nghiemthu\_VAT

6,78 NT

B\_Dexuat\_thanhtoan

7,39 NT

B\_BDHA\_Duyet


7,29 NT

B\_Chuyen\_Tien

7,13 NT

B\_Chua\_tra

159,55 T

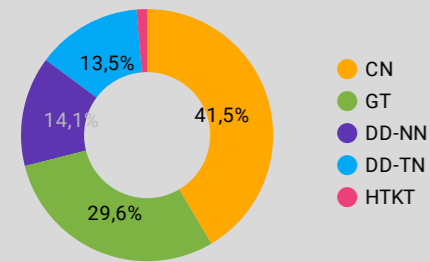

	Nhathau_vietta c	B_Uutien ^	B_Phan_loai_no	B_Dexuat_thanh toan	B_Chua_tra
1.	Khang Đức	1. Khẩn	1. Quá hạn	13,23 T	10,40 T
2.	Phan Vũ	1. Khẩn	1. Quá hạn	17,95 T	17,95 T
3.	Long Khánh	1. Khẩn	1. Quá hạn	2,56 T	2,56 T
4.	SHA	2. Gấp	1. Quá hạn	14,01 T	2,23 T
5.	PROCO	2. Gấp	1. Quá hạn	2,96 T	2,96 T
			<b>Tổng cộng</b>	<b>527,81 T</b>	<b>159,55 T</b>

	B_Nganhang	B_Uutien ^	B_Chua_tra
1.	Viettinbak	1. Khẩn	30,91 T
2.	Sacombank	2. Gấp	23,53 T
3.	Viettinbak	2. Gấp	22,76 T
4.	Vietbank	2. Gấp	82,02 T
5.	Viettinbak	3. Phải trả	329,40 Tr
			1 - 5 / 5 < >

	Ten_DA	Kyhieu_HS	Nhathau_viettac	Tg_Trinhoso	B_Uutien	B_Phan_loai_no	B_Nghiemthu_VAT	B_Dexuat_thanhtoan	B_Chuyen_Tien	B_Chua_tra	
1.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Quyết toán	Phú Văn	4 thg 4, 2023	2. Gấp	1. Quá hạn	103,88 T	103,88 T	21,86 T	82,02 T	
2.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan 17	Phú Văn	22 thg 11, 2021	-	-	72,23 T	0,00	0,00	0,00	
3.	Bệnh Viện Forgive	HS_Thanh_toan 1	Văn Hà	30 thg 12, 2019	-	-	68,53 T	54,83 T	54,83 T	0,00	
4.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan 18	Phú Văn	22 thg 12, 2021	-	-	68,16 T	45,76 T	45,76 T	0,00	
5.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan 22	Navicons	9 thg 3, 2023	-	-	58,26 T	58,26 T	58,26 T	0,00	
6.	Bệnh Viện Forgive	HS_Thanh_toan 20	Nam Thịnh	26 thg 1, 2022	-	-	57,00 T	57,00 T	57,00 T	0,00	
7.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan 5	Navicons	9 thg 7, 2020	-	-	54,17 T	24,38 T	24,38 T	0,00	
8.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan 4	Navicons	9 thg 6, 2020	-	-	53,08 T	23,89 T	23,89 T	0,00	
9.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan 6	Navicons	13 thg 8, 2020	-	-	52,72 T	23,72 T	23,72 T	0,00	
10.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan 15	Phú Văn	25 thg 8, 2021	-	-	52,35 T	23,56 T	23,56 T	0,00	
11.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan 14	Phú Văn	20 thg 7, 2021	-	-	52,23 T	23,50 T	23,50 T	0,00	
12.	Bệnh Viện Tâm Tâm	HS_Thanh_toan 1	Phú Văn	20 thg 7, 2021	-	-	52,23 T	23,50 T	23,50 T	0,00	
							<b>Tổng cộng</b>	<b>6,78 NT</b>	<b>7,39 NT</b>	<b>7,13 NT</b>	<b>159,55 T</b>

# BẢNG TỔNG HỢP THEO DỐI CÔNG NỢ NHÀ THẦU PHỤ

COVER



B_Phan_loai_no / B_Chua_tra			
B_Uutien	1. Quá hạn	4. Bình thường	2. Tới hạn
1. Khẩn	30,91 T	-	-
2. Gấp	128,31 T	1,38 Tr	5,47 Tr
3. Phải trả	323,57 Tr	5,84 Tr	-
<b>Tổng ...</b>	<b>159,54 T</b>	<b>7,22 Tr</b>	<b>5,47 Tr</b>

Nhathau_viettac	B_Uutien	B_TG_Chuyen_Tien	B_Dexuat_thanhtoan	B_Chua_tra
1. Khang Đức	1. Khẩn	30 thg 1, 2023	13,23 T	10,40 T
2. Phan Vũ	1. Khẩn	30 thg 1, 2023	17,95 T	17,95 T
3. Long Khánh	1. Khẩn	30 thg 1, 2023	2,56 T	2,56 T
4. Tú Tuyến	2. Gấp	8 thg 1, 2020	346,30 Tr	295,00 N
5. Cầu 14	2. Gấp	8 thg 5, 2019	3,29 T	998,00 N
6. VECS	2. Gấp	1 thg 6, 2019	1,67 T	944,00 N
<b>Tổng cộng</b>			<b>527,81 T</b>	<b>159,55 T</b>

Chọn phạm vi ngày

Nhathau\_viettac

Ten\_DA

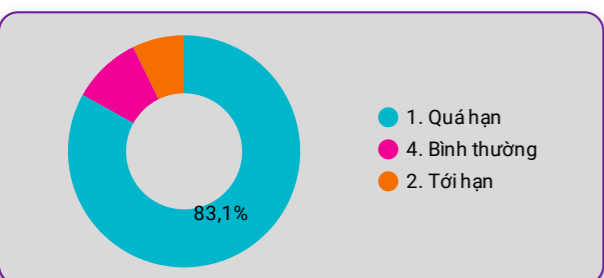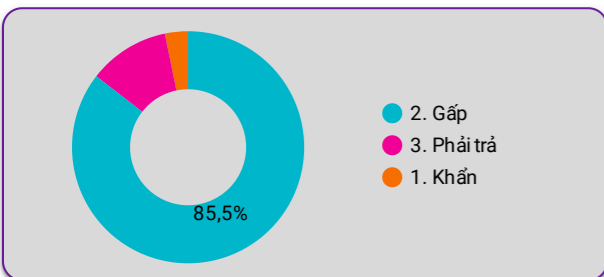





Ten_DA	Nhathau_viettac	Kyhieu_HS	B_So_Hopdongchinh	B_Tg_toiha_n	B_Tg_Tre_HS	B_Chua_tra
1. Bệnh Viện Tâm Tâm	Phú Văn	HS_Quyet toan	04/2020/ĐKTG/HĐXD	1 thg 3, 2023	-156	82,02 T
2. Nhà máy công nghệ cao Tùng Lâm	Phan Vũ	HS_Tam_ung	29/PV/HĐ-CC1-QT1	1 thg 3, 2023	-156	17,95 T
3. Nhà máy công nghệ cao Tùng Lâm	Khang Đức	HS_Thanh_toan1	31/KĐ/HĐ-CC1-QT1	27 thg 3, 2023	-130	10,40 T
4. Cầu Dây văng 1	Phú Văn - CC1	HS_Thanh_toan 10	1061/HĐ-DACPH02/2021/CC1-MK	1 thg 3, 2023	-156	7,39 T
5. Cầu Dây văng 1	Phú Văn - CC1	HS_Thanh_toan 11	1061/HĐ-DACPH02/2021/CC1-MK	1 thg 3, 2023	-156	6,02 T
6. Đê Chấn sóng Biển	Phú Văn - CC1	HS_Thanh_toan 11	949/HĐ-DAB2/2021/CC1-MK	1 thg 3, 2023	-156	4,91 T
7. Đường liên Tỉnh XL3	Đạt Phương	HS_Thanh_toan 15	02/2018/HĐTC/CC1-ĐP	8 thg 3, 2021	-879	4,53 T
8. Cầu Dây văng 1	Indochina	HS_Thanh_toan 1	02/HĐ-DACPH02/2022/CC1-SHQ	1 thg 3, 2023	-156	4,25 T
9. Đường liên Tỉnh XL1	Lam Kinh	HS_Thanh_toan 4	31/2020/HĐTC/CC1-DONGTAM	8 thg 8, 2021	-726	4,20 T
1... Đường liên Tỉnh XL1	PROCO	HS_Thanh_toan 6	09/2022/HĐTC/CC1-PROCO	15 thg 4, 2023	-111	2,96 T
1... Đường liên Tỉnh XL3	Đạt Phương	HS_Thanh_toan 16	02/2018/HĐTC/CC1-ĐP	8 thg 4, 2021	-848	2,58 T
1... Đường liên Tỉnh XL2	SHA	HS_Thanh_toan 16	29/2019/HĐTC/CC1-SHA	8 thg 4, 2023	-118	2,22 T
1... Nhà máy công nghệ cao Tùng Lâm	Long Khánh	HS_Thanh_toan4	16/TA/HĐ-CC1-OT1	1 thg 3, 2023	-156	2,11 T
<b>Tổng cộng</b>						<b>159,55 T</b>

# BẢNG TỔNG HỢP THEO DỐI BẢO LÃNH

COVER

Ten\_DA

Phụ trách

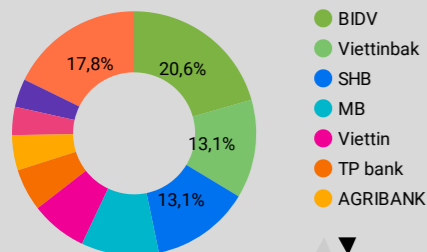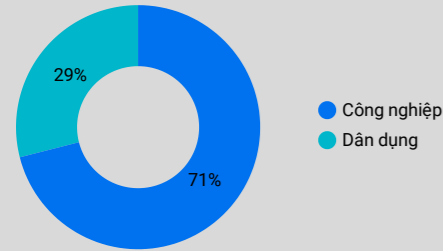

Ten_DA	Loại bao lãnh	Donviphathanh_BL	Donvithuong_BL	Ngan hang_BL	Ngay het han_BL	Tinh trang_BL	Giatri_BL
1. Nhà máy công nghệ cao Cao Hùng	Bảo lãnh tạm ứng	CC1	CĐT SYT trà vinh	Vietbank	7 thg 5, 2023	89	539,57 T
2. Bệnh Viện Tâm Tâm	Bảo lãnh hợp đồng	CC1	CĐT Alphanam	SHB	31 thg 7, 2023	4	13,09 T
3. Nhà máy TOPT Textiles Nam Định	Bảo lãnh tạm ứng	Long Khánh	CC1	AB Bank	31 thg 7, 2023	4	2,29 T
4. Nhà máy TOPT Textiles Nam Định	Bảo lãnh hợp đồng	Tiến Thành Nghi Sơn	CC1	AGRIBANK	31 thg 7, 2023	4	476,38 Tr
5. Nhà máy TOPT Textiles Nam Định	Bảo lãnh tạm ứng	Tiến Thành Nghi Sơn	CC1	AGRIBANK	31 thg 7, 2023	4	2,60 T
6. Nhà máy TOPT Textiles Nam Định	Bảo lãnh hợp đồng	Long Khánh	CC1	AB Bank	31 thg 7, 2023	4	618,33 Tr
7. Nhà máy công nghệ cao An Đức	Bảo lãnh tạm ứng	CC1	CĐT Alphanam	SHB	1 thg 7, 2023	34	12,12 T
<b>Tổng cộng</b>							<b>1,11 NT</b>

Ten_DA	Loại bao lãnh	Donviphathanh_B	Donvithuong_BL	Ngan hang_BL	Ngay het han_BL	Ty le_BL	Tinh trang_BL	Giatri_BL
1. Nhà máy công nghệ cao Thăng Lợi	Bảo lãnh tạm ứng	CC1	BQL CDT Tiền Giang	Vietbank	3 thg 5, 2023	45,00%	Hoàn thành	570,20 T
2. Nhà máy công nghệ cao Cao Hùng	Bảo lãnh tạm ứng	CC1	CĐT SYT trà vinh	Vietbank	7 thg 5, 2023	60,00%	89	539,57 T
3. Khách sạn Dream think	Bảo lãnh tạm ứng	Phú Văn	CC1	BIDV	28 thg 10, 2021	45,00%	Hoàn thành	207,62 T
4. Khách sạn Dream think	Bảo lãnh tạm ứng	Navicons	CC1	MB	9 thg 12, 2021	45,00%	Hoàn thành	204,62 T
5. Nhà máy công nghệ cao Tường Minh	Bảo lãnh tạm ứng	CC1	CĐT BQLDDCN	SHB	13 thg 9, 2024	-	-406	169,00 T
6. Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 - gói thầu 12	Bảo lãnh hợp đồng	CC1	Doosan	VietinBank	23 thg 12, 2022	15,00%	Hoàn thành	84,47 T
7. Bệnh Viện Forgive	Bảo lãnh hợp đồng	Phú Văn	BQL CDT Tiền Giang	Vietbank	28 thg 4, 2023	5,00%	Hoàn thành	79,28 T
8. Nhà máy công nghệ cao Tường Minh	Bảo lãnh tạm ứng	Đức Hùng	CC1	VPbank	2 thg 7, 2020	30,00%	Hoàn thành	63,98 T
9. Nhiệt điện Quảng Trạch 1	Bảo lãnh hợp đồng	Phú Xuân	CC1	BIDV	8 thg 3, 2024	10,00%	-217	55,62 T
<b>Tổng cộng</b>								<b>3,03 NT</b>



[HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH](#)

[XEM BÁO CÁO TRỰC TIẾP](#)

[Xem trên Tiktok](#)

[Xem trên Facebook](#)

<https://huanluyenkysu.com/> hoặc <https://nhatnghe.net/>

[TÌM HIỂU THÊM](#)

**NHAT NGHE**  
NÂNG TẦM XÂY DỰNG VIỆT

**HOTLINE - 0786.776868**
